



GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

O maior programa da história rodoviária de Santa Catarina



Agosto de 2025





Apresentação

**Estrutura
Organizacional**

**Coordenadorias
Regionais**


Malha Viária

Obras Estruturantes

Destaques

Obras SC-305 e SC-283

Estrutura Organizacional

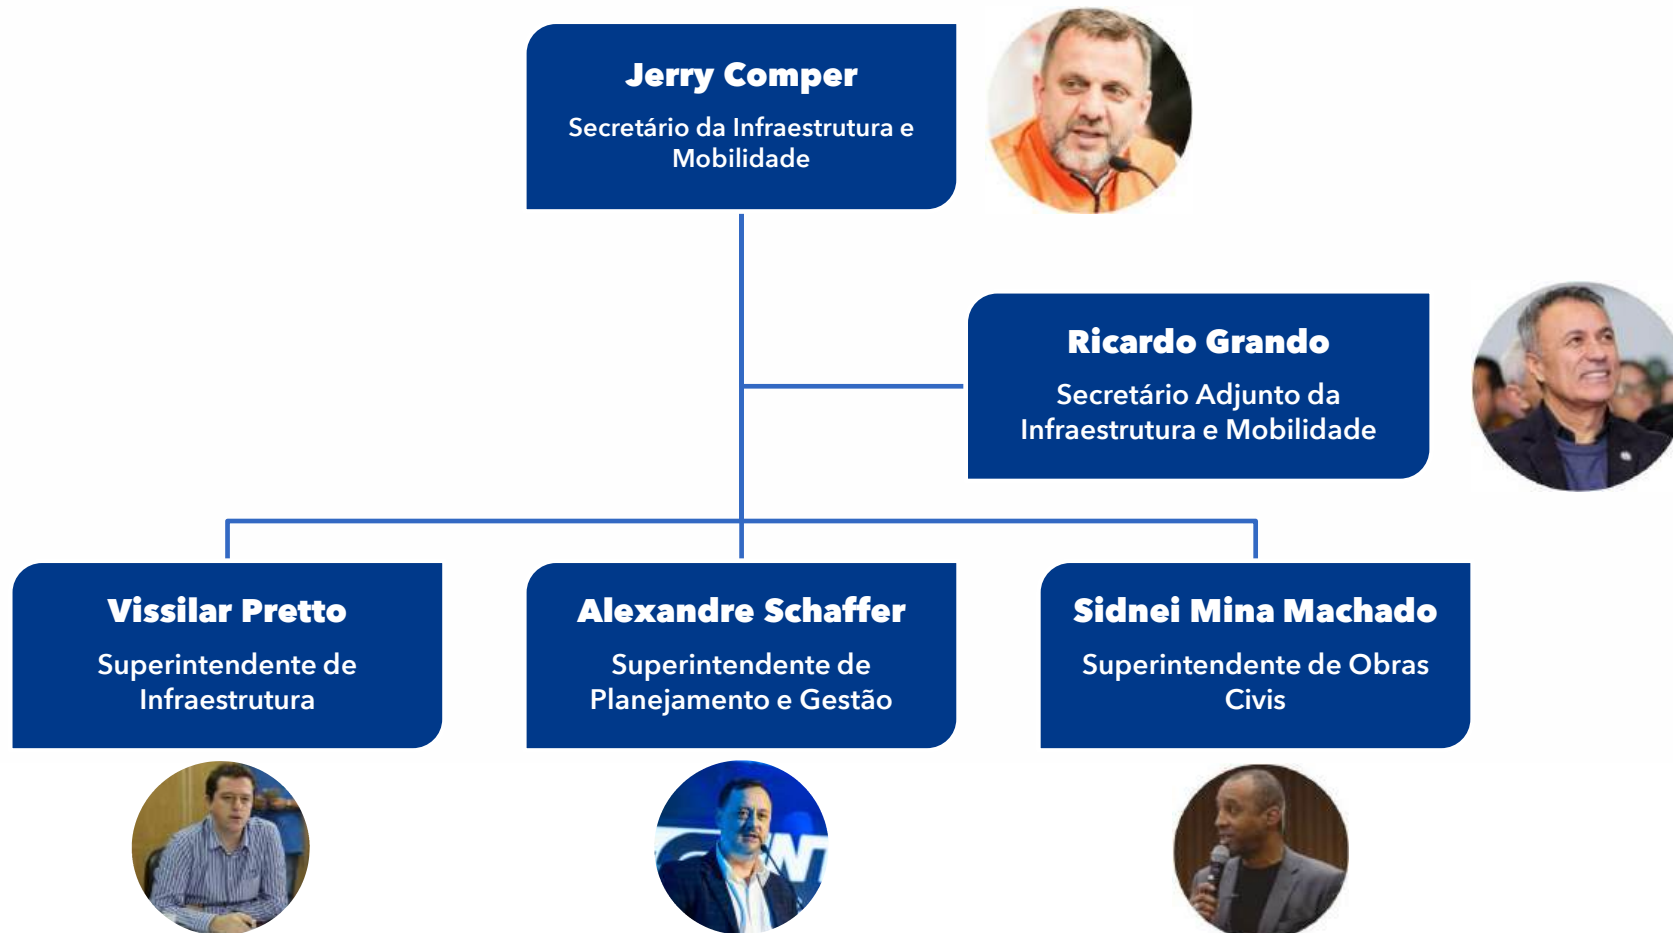

Quadro de Pessoal

Situação	Quantidade
Efetivos - Engenheiros	128
Efetivos - Demais	125
Efetivos - Engenheiros na SED	37
Servidores efetivos cedidos a SCPAR	161
Servidores efetivos cedidos a outros órgãos	26
Servidores efetivos recebidos a disposição	19
Total de Servidores	461

Funcionários Inativos	1.522
------------------------------	--------------

Apresentação

**Estrutura
Organizacional**

**Coordenadorias
Regionais**


Malha Viária

Obras Estruturantes

Destaques

Obras SC-305 e SC-283

Coordenadorias Regionais

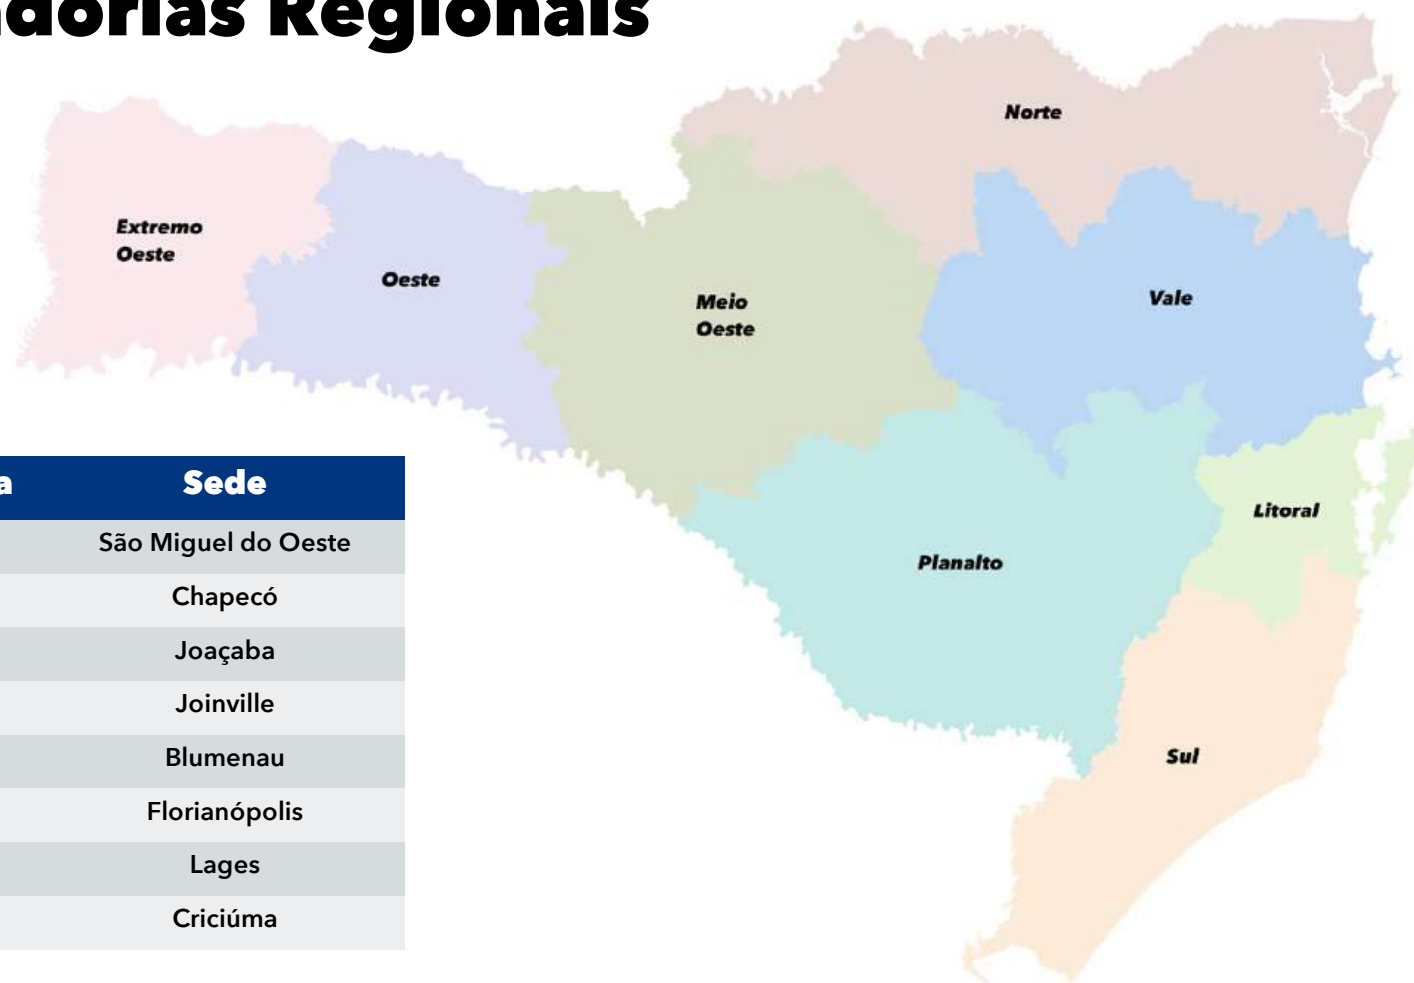

Coordenadoria	Sede
Extremo Oeste	São Miguel do Oeste
Oeste	Chapecó
Meio Oeste	Joaçaba
Norte	Joinville
Vale	Blumenau
Litoral	Florianópolis
Planalto	Lages
Sul	Criciúma

Apresentação

**Estrutura
Organizacional**

**Coordenadorias
Regionais**


Malha Viária

Obras Estruturantes

Destaques

Obras SC-305 e SC-283

Malha Viária

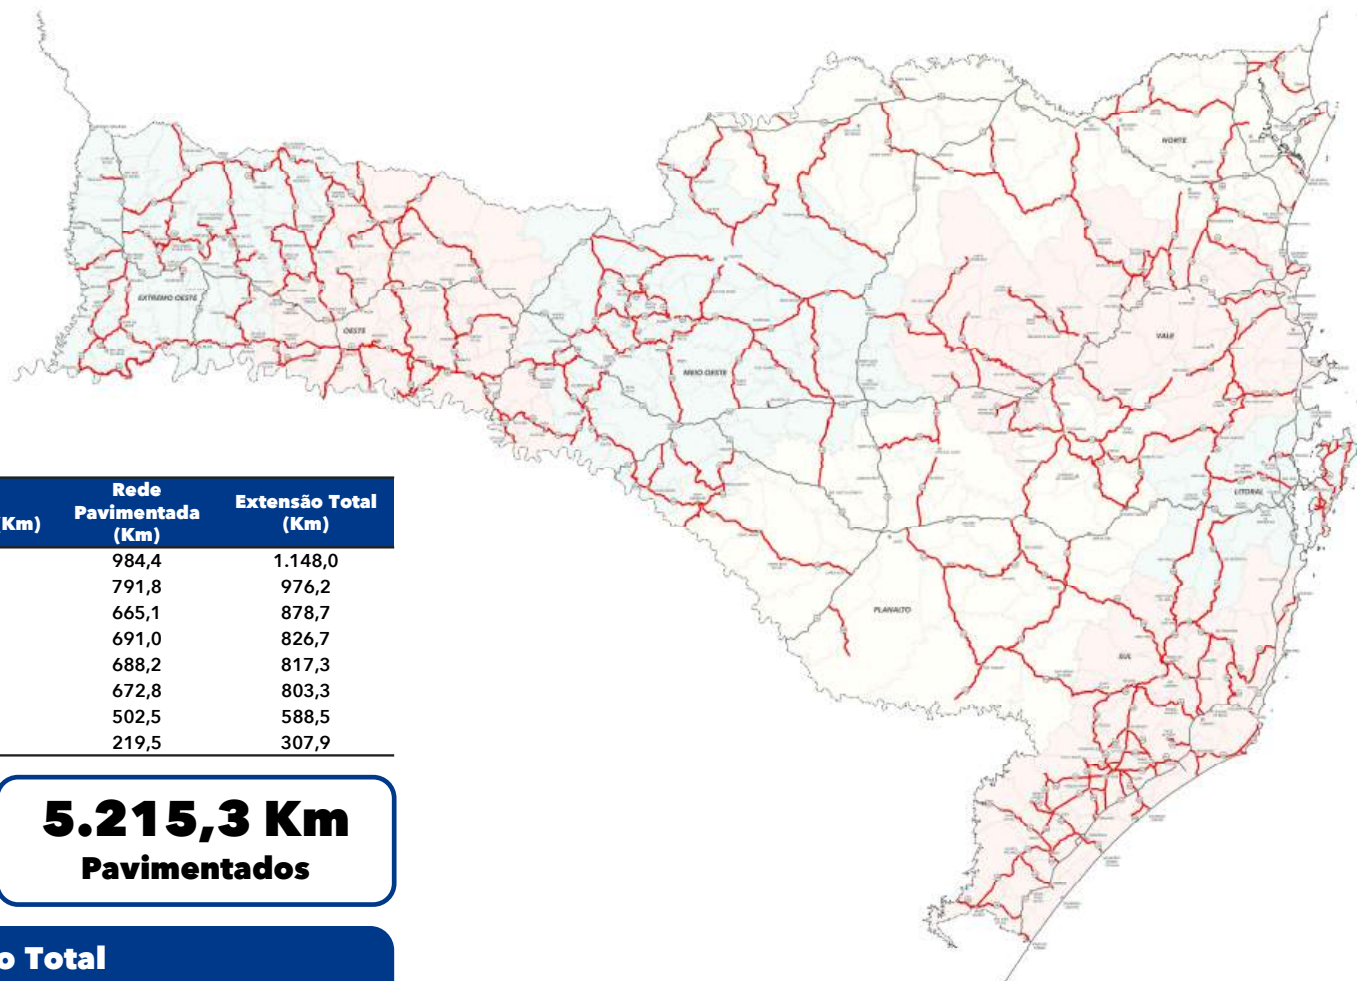

Coordenadoria Regional	Rede Não Pavimentada (Km)	Rede Pavimentada (Km)	Extensão Total (Km)
Meio Oeste	163,6	984,4	1.148,0
Sul	184,4	791,8	976,2
Planalto	213,6	665,1	878,7
Extremo Oeste	135,7	691,0	826,7
Oeste	129,1	688,2	817,3
Vale	130,5	672,8	803,3
Norte	86,0	502,5	588,5
Litoral Centro	88,4	219,5	307,9

1.131,3 Km
Não pavimentados

5.215,3 Km
Pavimentados

Extensão Total
6.346,6 Km

Apresentação

**Estrutura
Organizacional**

**Coordenadorias
Regionais**

Malha Viária

Obras Estruturantes

Destaques

Obras SC-305 e SC-283

Visão Geral Estrada Boa

Obras Estruturantes e Revitalizações

100 Obras

Investimento de
R\$ 3,5 bilhões



Coordenadoria Regional Litoral

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Andamento	Estruturante	SC 281 - São Pedro de Alcântara - Angelina	135.682.120,43	11,53%
A iniciar	Estruturante	SC 108 - Santa Rosa de Lima - Anitápolis	150.670.643,68	-
A reiniciar	Estruturante	SC 108 - Major Gercino - Angelina	166.299.011,19	0,06%
Concluída	Iluminação	Iluminação cênica da Ponte Hercílio Luz	9.379.156,82	100,00%
Andamento	Estruturante	Melhoramento da SC 401 em Florianópolis	55.983.533,75	20,00%
Relicitar	Estruturante	Pontes Colombo Salles e Pedro Ivo	13.431.952,78	8,32%
Concluída	Estruturante	Readequação Intersecção Ingleses - Barra da Lagoa - SC 406 - Entr. SC 403	781.931,87	100,00%
Concluída	Estruturante	SC 401 - Passarela de Pedestres	2.300.142,01	100,00%
	Emergencial	Obras Emergenciais	19.292.256,95	


Obras Estruturantes - Litoral

Destaques

Implantação e pavimentação da SC-281 trecho São Pedro de Alcântara - Angelina



Iluminação Cênica na Ponte Hercílio Luz

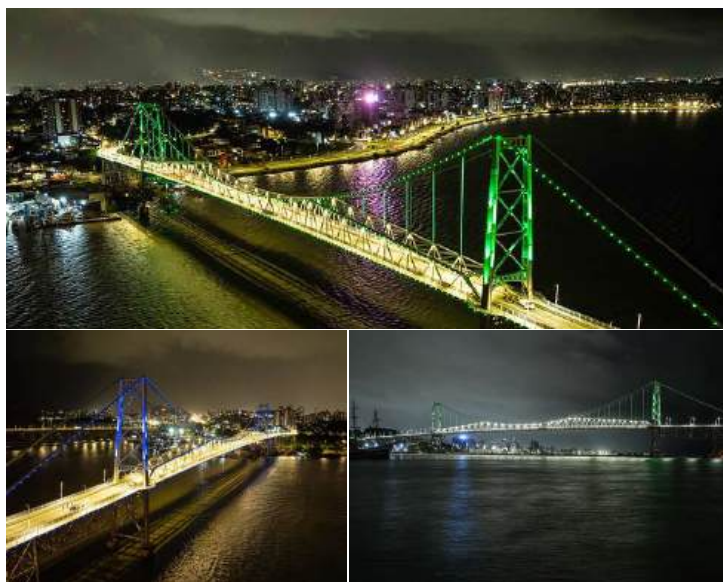

3ª pista na SC-401 trecho Santo Antônio de Lisboa - Itacorubi



Coordenadoria Regional Norte

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Andamento	Estruturante	BR 280 Viaduto do Guamiranga –Liberação 29/04 (Concluída)	67.634.724,76	64,55%
		BR 280 Viaduto do Manes –Rumo		
		BR 280 Passarela da Lunelli (Concluída)		
		BR 280 Ponte do Portal (Concluída)		
		BR 280 2 Passarelas		
Paralisado/ Análise	Estruturante	SC 414 Luiz Alves - SC 108 - Massaranduba	72.901.360,96	31,42%
Concluída	Estruturante	SC 340 Porto União - Santa Cruz do Timbó	26.947.648,57	100,00%
Andamento	Estruturante	SC 477 - Canoinhas - Monte Castelo	130.267.447,17	94,42%
Andamento	Estruturante	SC 108 - Guaramirim - Massaranduba - 3,8 Km	80.000.000,00	12,21%
Andamento	Estruturante	SC 108 - Guaramirim - Massaranduba	158.467.076,04***	
A reiniciar	Estruturante	SC 462 - Matos Costa - General Carneiro - PR	80.997.583,06***	Ordem de serviço
Andamento	Estruturante	Áreas de Escape - SC 418 - Serra Dona Francisca	35.494.796,56	5,22%
Andamento	Estruturante	SC 114 - Itaiópolis - BR 116	7.233.004,58	35,49%
Concluída	Estruturante	Elevado SC 418 - Acesso Industrial de Joinville	19.853.377,70	100,00%
	Emergencial	Obras Emergenciais	3.202.784,72	

Obras Estruturantes - Norte

Destaques

Restauração com aumento de capacidade da SC-477 trecho Canoinhas - Monte Castelo



Obras de Artes Especiais na BR-280 trecho Guaramirim - Jaraguá do Sul



Reabilitação e duplicação da SC-108 Guaramirim - Massaranduba



Coordenadoria Regional Vale

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Paralisado/ Análise	Estruturante	SC 108 - Vila Itoupava - Acesso norte - Blumenau 5.1 KM	40.000.000,00	24,58%
Paralisado/ Análise	Estruturante	SC 108 - Vila Itoupava - Acesso norte –Blumenau	103.690.126,33	
Andamento	Estruturante	SC 281 - Ituporanga –Atalanta	99.822.162,86	71,92%
Andamento	Estruturante	SC 110 - Jaraguá do Sul - pé da Serra –Pomerode	38.510.312,45	65,25%
Andamento	Estruturante	SC 486 - Interseção Antônio Heil –Brusque	60.442.921,56	81,93%
A reiniciar	Estruturante	SC 108 - Viaduto Guilherme Scharf - Vila Itoupava	7.906.768,62	93,12%
A iniciar	Estruturante	Aldeia Bugio ao Município de José Boiteux	7.082.856,52	-
Andamento	Estruturante	Acostamento e ciclofaixa das SC 112 e SC 281 em Trombudo Central - Atalanta	9.741.182,64	24,75%
Paralisado/ Análise	Estruturante	Estabilização de Muro Terra em Dr. Pedrinho	23.974.099,18	-
	Emergencial	Obras Emergenciais	144.644.667,29	

Obras Estruturantes - Vale

Destaques

Restauração SC-110 trecho entre Pé da Serra até Pomerode



Trevo de Itajaí Interseção na Rodovia SC- 486 (Rod. Antônio Heil) com a BR-101



Pavimentação da SC-281 Trecho: Ituporanga até Atalanta



Coordenadoria Regional Planalto

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Andamento	Estruturante	Pavimentação SC 370 – Serra do Corvo Branco	50.371.656,06	44,12%
Andamento	Estruturante	Pavimentação SC 370 – Rio Rufino – Urubici	180.724.830,55	17,31%
Concluído	Estruturante	SC 350 - Contenção Acesso a Imbuia	12.259.622,37	100,00%
	Emergencial	Obras Emergenciais	144.644.667,29	

Obras Estruturantes - Planalto

Destaques

Pavimentação da SC-370 Trecho Urubici - Grão Pará (Serra do Corvo Branco)



Implementação e pavimentação na SC-370 Trecho de Rio Rufino a Urubici



Contenção no Acesso a Imbuia SC-350



Coordenadoria Regional Sul

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Andamento	Estruturante	SC 437 - Aratingaúba - Imaruí	23.355.648,52	7,85%
Andamento	Estruturante	Anel Viário de Criciúma	24.695.359,87	54,67%
Andamento	Estruturante	SC 290 - Praia Grande Div SC/RS Serra do Faxinal	75.594.326,34	50,66%
Andamento	Estruturante	SC 437 - Imaruí - Pescaria Brava	15.467.356,12	79,79%
Concluída	Estruturante	SC 443 - Rodovia Quinto de Baldessar	16.755.354,76	100,00%
Andamento	Estruturante	SC 445 - Trecho: Içara - Criciúma	45.383.165,39	73,07%
Andamento	Estruturante	SC 108 - Praia Grande - Jacinto Machado	77.859.980,62	28,76%
Andamento	Estruturante	SC 434 - Implantação Ciclofaixa - Garopaba	2.823.898,64	52,49%
Andamento	Estruturante	Dupl. Criciúma - Urussanga e Cont. de Cocal do Sul	60.000.000,00	6,41%
Andamento	Estruturante	SC 108 - Contorno viário Urussanga e cont. de Cocal do Sul	168.225.695,71	

Continua...

Coordenadoria Regional Sul

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Andamento	Estruturante	SC 435 São Bonifácio - São Martinho	50.830.000,00	11,86%
A reiniciar	Estruturante	São Martinho - SC 436/437 –Albertina Berkenbrock	91.300.935,88***	Ordem de serviço
A reiniciar	Estruturante	SC 442 - Cocal do Sul - Morro da Fumaça	8.561.391,19	Relicitar
A reiniciar	Estruturante	SC 435 - Pontes sobre São Bonifácio - São Martinho	6.500.000,00	-
	Emergencial	Obras Emergenciais	45.370.170,94	

Obras Estruturantes - Sul

Destaques

Implementação e pavimentação SC-290 Trecho Praia Grande Divisa SC/RS (Serra do Faxinal)



Pavimentação SC-108 Trecho Jacinto Machado - Praia Grande



Duplicação da SC-108 Trecho Urussanga - Criciúma e Cocal do Sul



Coordenadoria Regional Meio Oeste

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Andamento	Estruturante	SC 452 - Abdon Batista - Vargem	103.177.175,41	42,05%
Concluída	Estruturante	SC 150 - Capinzal - Piratuba	92.469.673,11	100,00%
Andamento	Estruturante	SC 465 - Macieira - Arroio Trinta	66.605.355,44	69,98%
Andamento	Estruturante	SC 355 - Catanduvas - Jaborá	58.556.149,61	10,97%
Andamento	Estruturante	SC 120 - Lebon Régis - Curitibaanos	168.573.646,62	74,98%
Andamento	Estruturante	SC 452 - Frei Rogério - Fraiburgo	64.736.636,27	18,56%
Andamento	Estruturante	SC 303 – Contorno Viário de Rio das Antas	7.782.476,41	64,15%
Paralisado/ Análise	Estruturante	SC 462 - Matos Costa - General Carneiro PR	80.997.583,06	0,31%
	Emergencial	Obras Emergenciais	45.565.840,20	

Obras Estruturantes - Meio Oeste

Destaques

Restauração com aumento de capacidade da SC-150 Trecho entre Capinzal e Piratuba



Restauração com aumento da capacidade da SC-120 Trecho entre Lebon Régis e Curitibaanos



Implantação e Pavimentação da SC-452 Trecho entre Frei Rogério até Fraiburgo



Coordenadoria Regional Oeste

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Andamento	Estruturante	SC 283 - Arvoredo - Seara	134.791.585,83	9,76%
Andamento	Estruturante	SC 283 - Arabutã - Concórdia	37.895.848,88	39,70%
Andamento	Estruturante	SC 156 - São Domingos - Div SC/ PR	92.397.826,33	47,23%
Andamento	Estruturante	SC 350- Abelardo Luz - Passos Maia - Lote 1	118.684.175,52	35,39%
Andamento	Estruturante	SC 283 - Águas de Chapecó –São Carlos –Palmitos	84.674.113,17	62,23%
Andamento	Estruturante	SC 350 - Abelardo Luz- Passo Maia - Lote 2	83.778.901,16	42,05%
A iniciar	Estruturante	SC 283 - Seara - Arabutã		Em Análise
Paralisado/ Análise	Estruturante	SC 283 - Chapecó - Arvoredo	36.835.841,03	77,43%
Concluído	Estruturante	SC 155 - BR 280 Rincão - Abelardo Luz	23.522.177,95	100,00%
Concluído	Estruturante	SC 484 - Guatambu - Caxambu do Sul	12.144.151,49	100,00%

Obras Estruturantes - Oeste

Destaques

Restauração com Aumento da Capacidade da SC-283 trecho Chapecó Arvoredo



Implantação e Pavimentação da SC-156 trecho entre São Domingos e a Divisa PR/SC



Implantação e Pavimentação da SC-350 trecho Abelardo Luz - Passos Maia



Coordenadoria Regional Extremo Oeste

Situação	Tipo	Obra	Valor Contrato (R\$)	Perc. Exec.
Andamento	Estruturante	SC 492 - São Miguel da Boa Vista - Romelândia	44.918.542,37	60,82%
Andamento	Estruturante	SC 305 - São Lourenço Campo Erê	143.620.829,50	53,95%
Andamento	Estruturante	SC 160 - Pinhalzinho, Modelo e Serra Alta	110.324.449,26	78,77%
Revisão de projeto	Estruturante	SC 283 - Ponte Sobre o Rio Macuco - Itapiranga	4.794.110,43	17,15%

Obras Estruturantes - Extremo Oeste

Destaques

Implantação e Pavimentação da SC-492 trecho São Miguel da Boa Vista - Romelândia



Restauração da SC-160 Entroncamento Bom Jesus do Oeste até a BR-282 em Pinhalzinho



Revitalização SC-161 em Palma Sola



Apresentação

**Estrutura
Organizacional**

**Coordenadorias
Regionais**

Malha Viária

Obras Estruturantes

Destaques

Obras SC-305 e SC-283

Via Mar

Etapas dos Projetos Executivos para Implantação da Via Mar

- Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) **ELABORADO**
- Projetos Executivos para 4 Lotes **EM ANDAMENTO**
- Estudos Ambientais para 4 Lotes **EM ANDAMENTO**
- Projeto Executivo Remanescente (Lote 5) **LICITAÇÃO 2º SEMESTRE**

Extensão
145,215 Km



Via Mar

Projetos em Execução:

Joinville (Entr. BR-101) - Rod. Antônio Heil (Entr. SC-486)

Lote	Trecho	Extensão	Valor
1	Entr. BR-101 – Entr. BR-280	26,85	R\$ 2.208.061,41
2	Entr. BR-280 – Entr. SC-415	21,09	R\$ 2.003.731,00
3	Entr. SC-415 – Entr. SC-414	16,77	R\$ 2.212.430,00
4	Entr. SC-414 – Entr. SC-486	25,78	R\$ 3.185.204,65
Total		90,49	R\$ 9.609.427,06


Remanescente:

Rod. Antônio Heil (Entr. SC-486) - Contorno de Florianópolis


Extensão: 54,72 Km

Obras de Arte Especiais:

Dois Viadutos
Dez pontes
Túnel

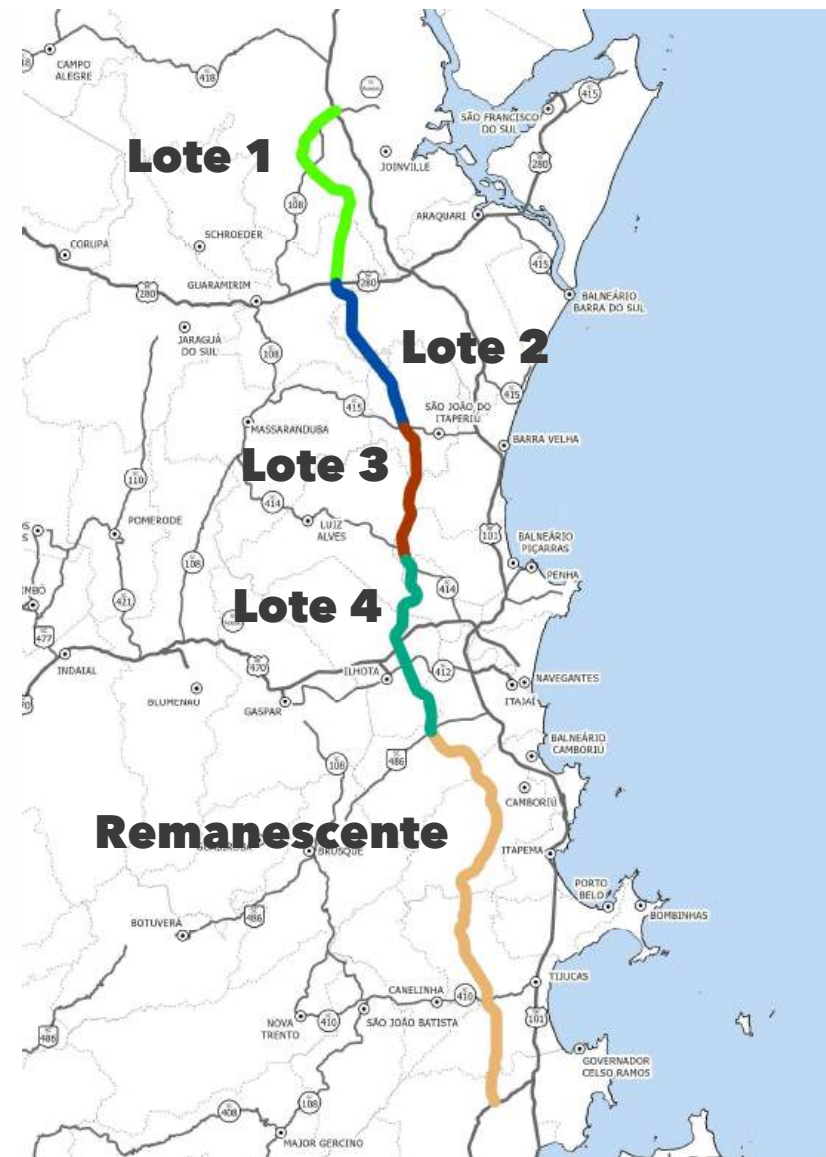


Via Mar

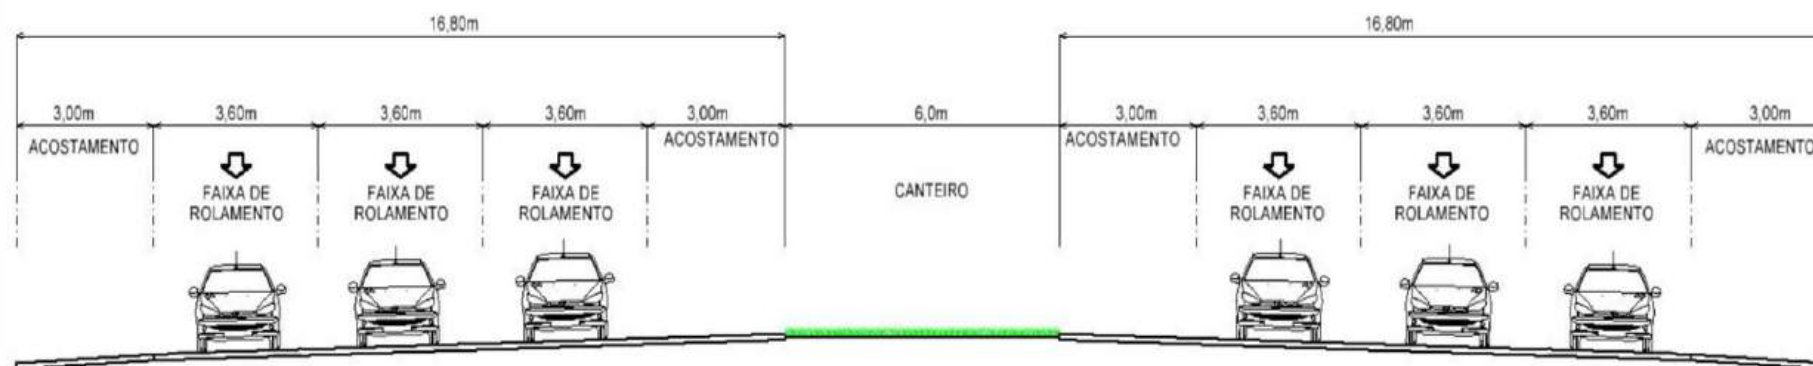

Obras Estruturantes

Contorno do Morro dos Cavalos

Extensão
5,2 Km

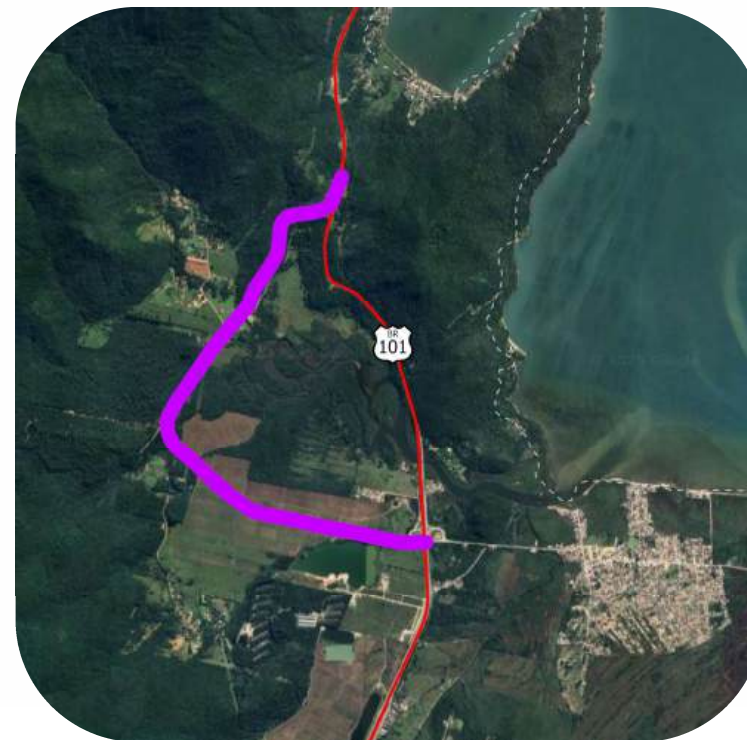

Apresentação

**Estrutura
Organizacional**


**Coordenadorias
Regionais**

Malha Viária

Obras Estruturantes

Destaques

Obras SC-305 e SC-283

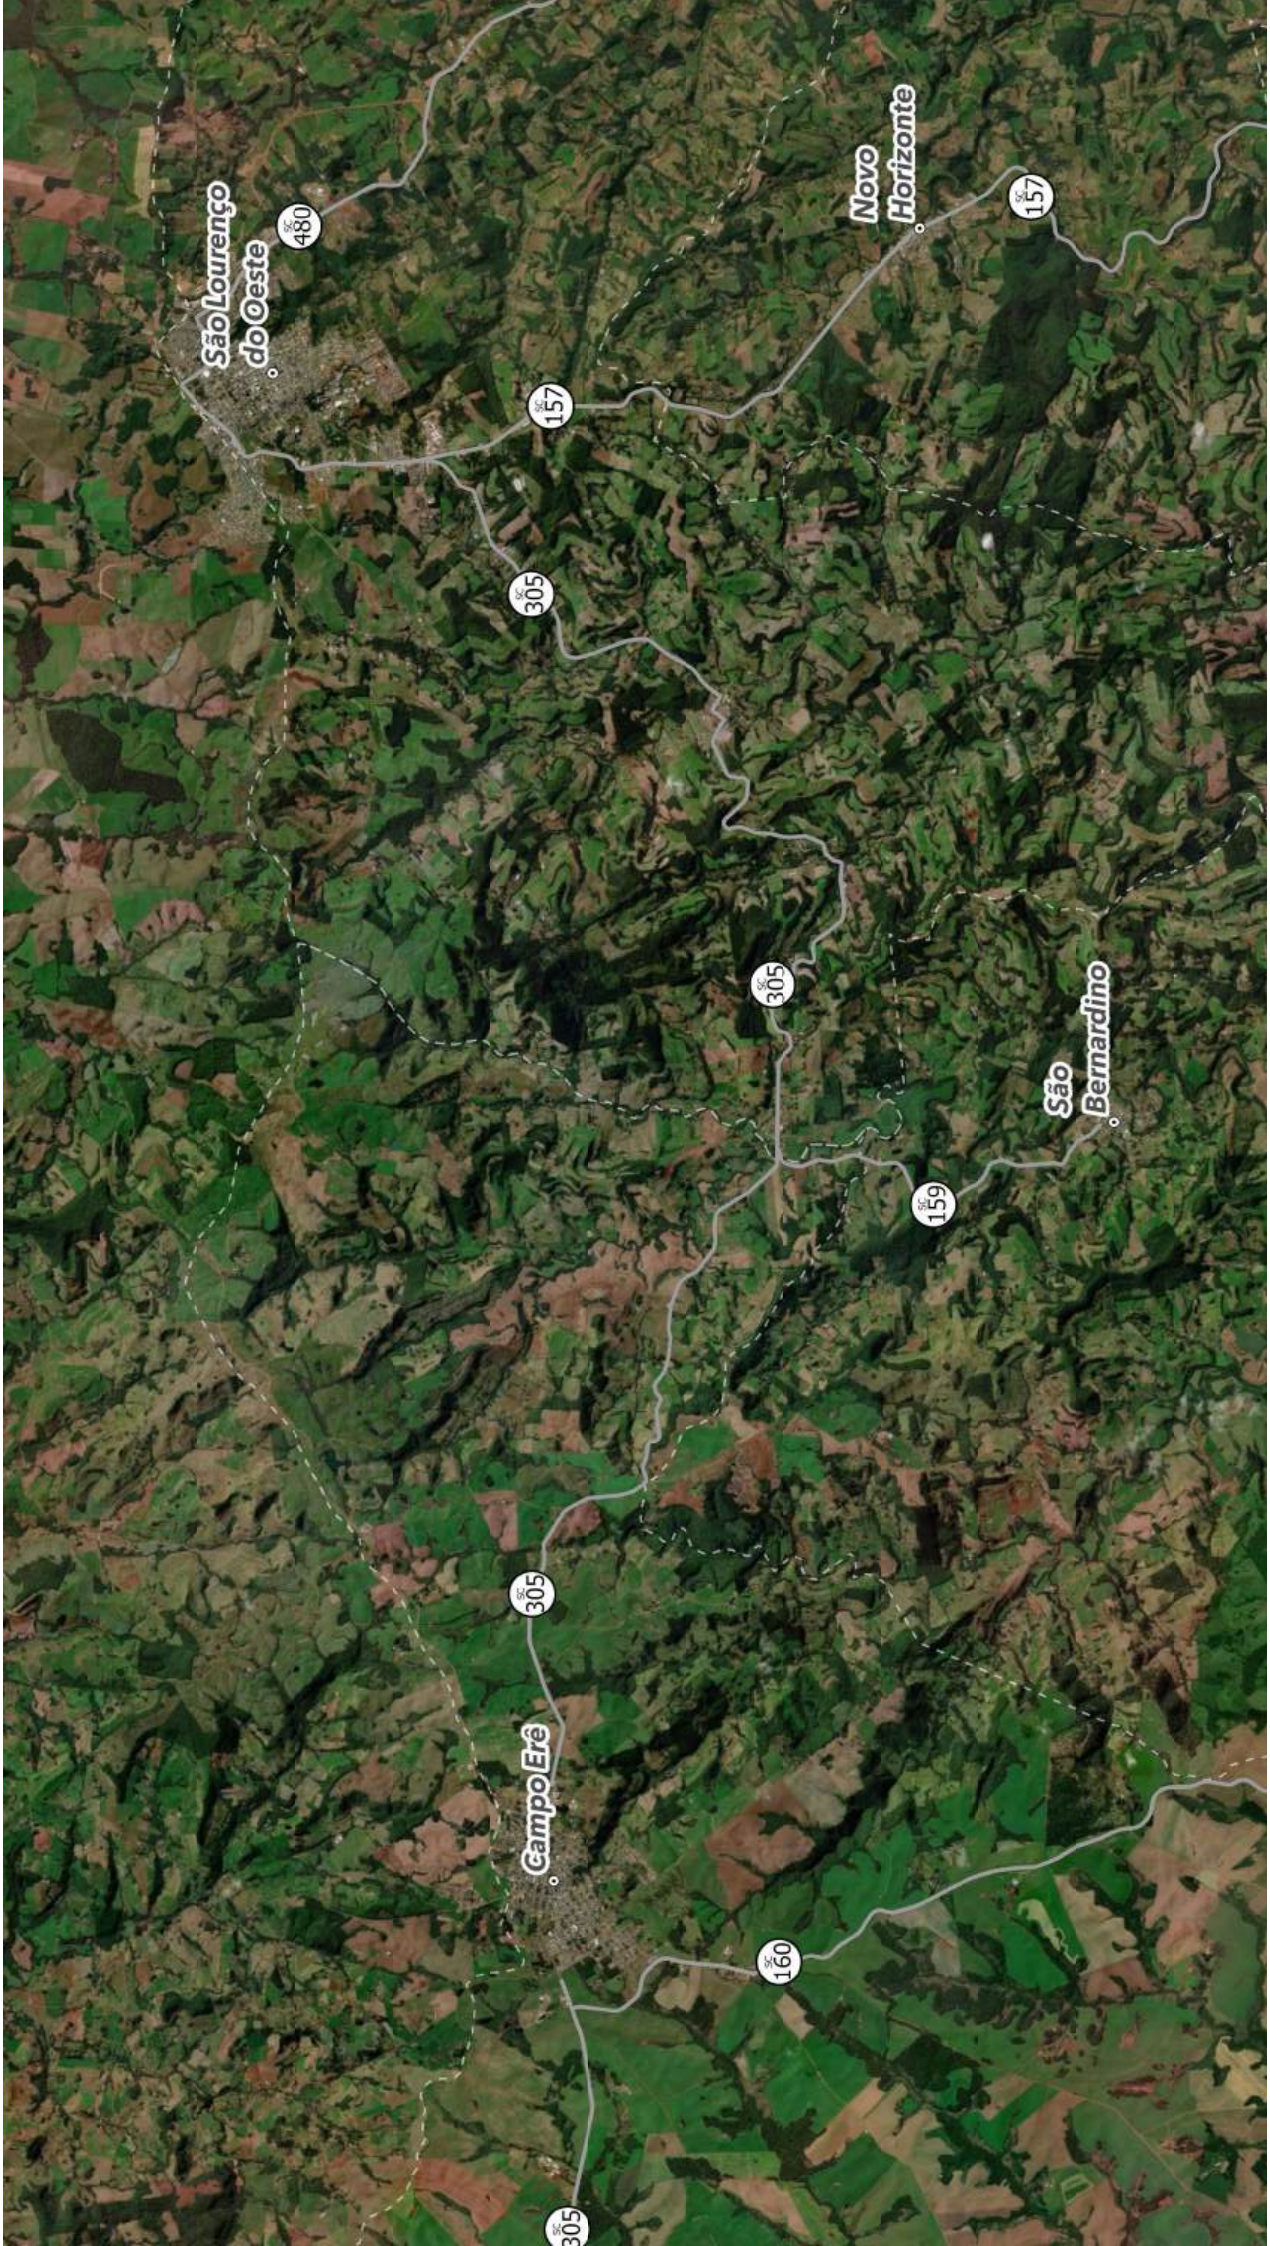


SC-305


São Lourenço do Oeste - Campo Erê

**Restauração com aumento
de Capacidade da SC-305
trecho São Lourenço do
Oeste - Campo Erê**

**Investimento
R\$ 143.620.829,50**

**Extensão
28 Km**

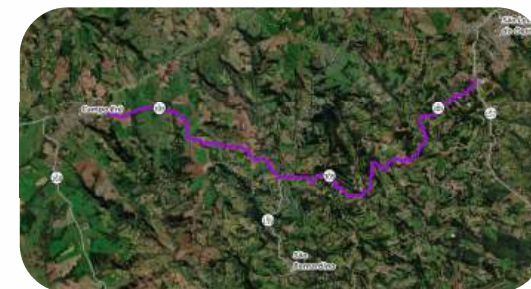

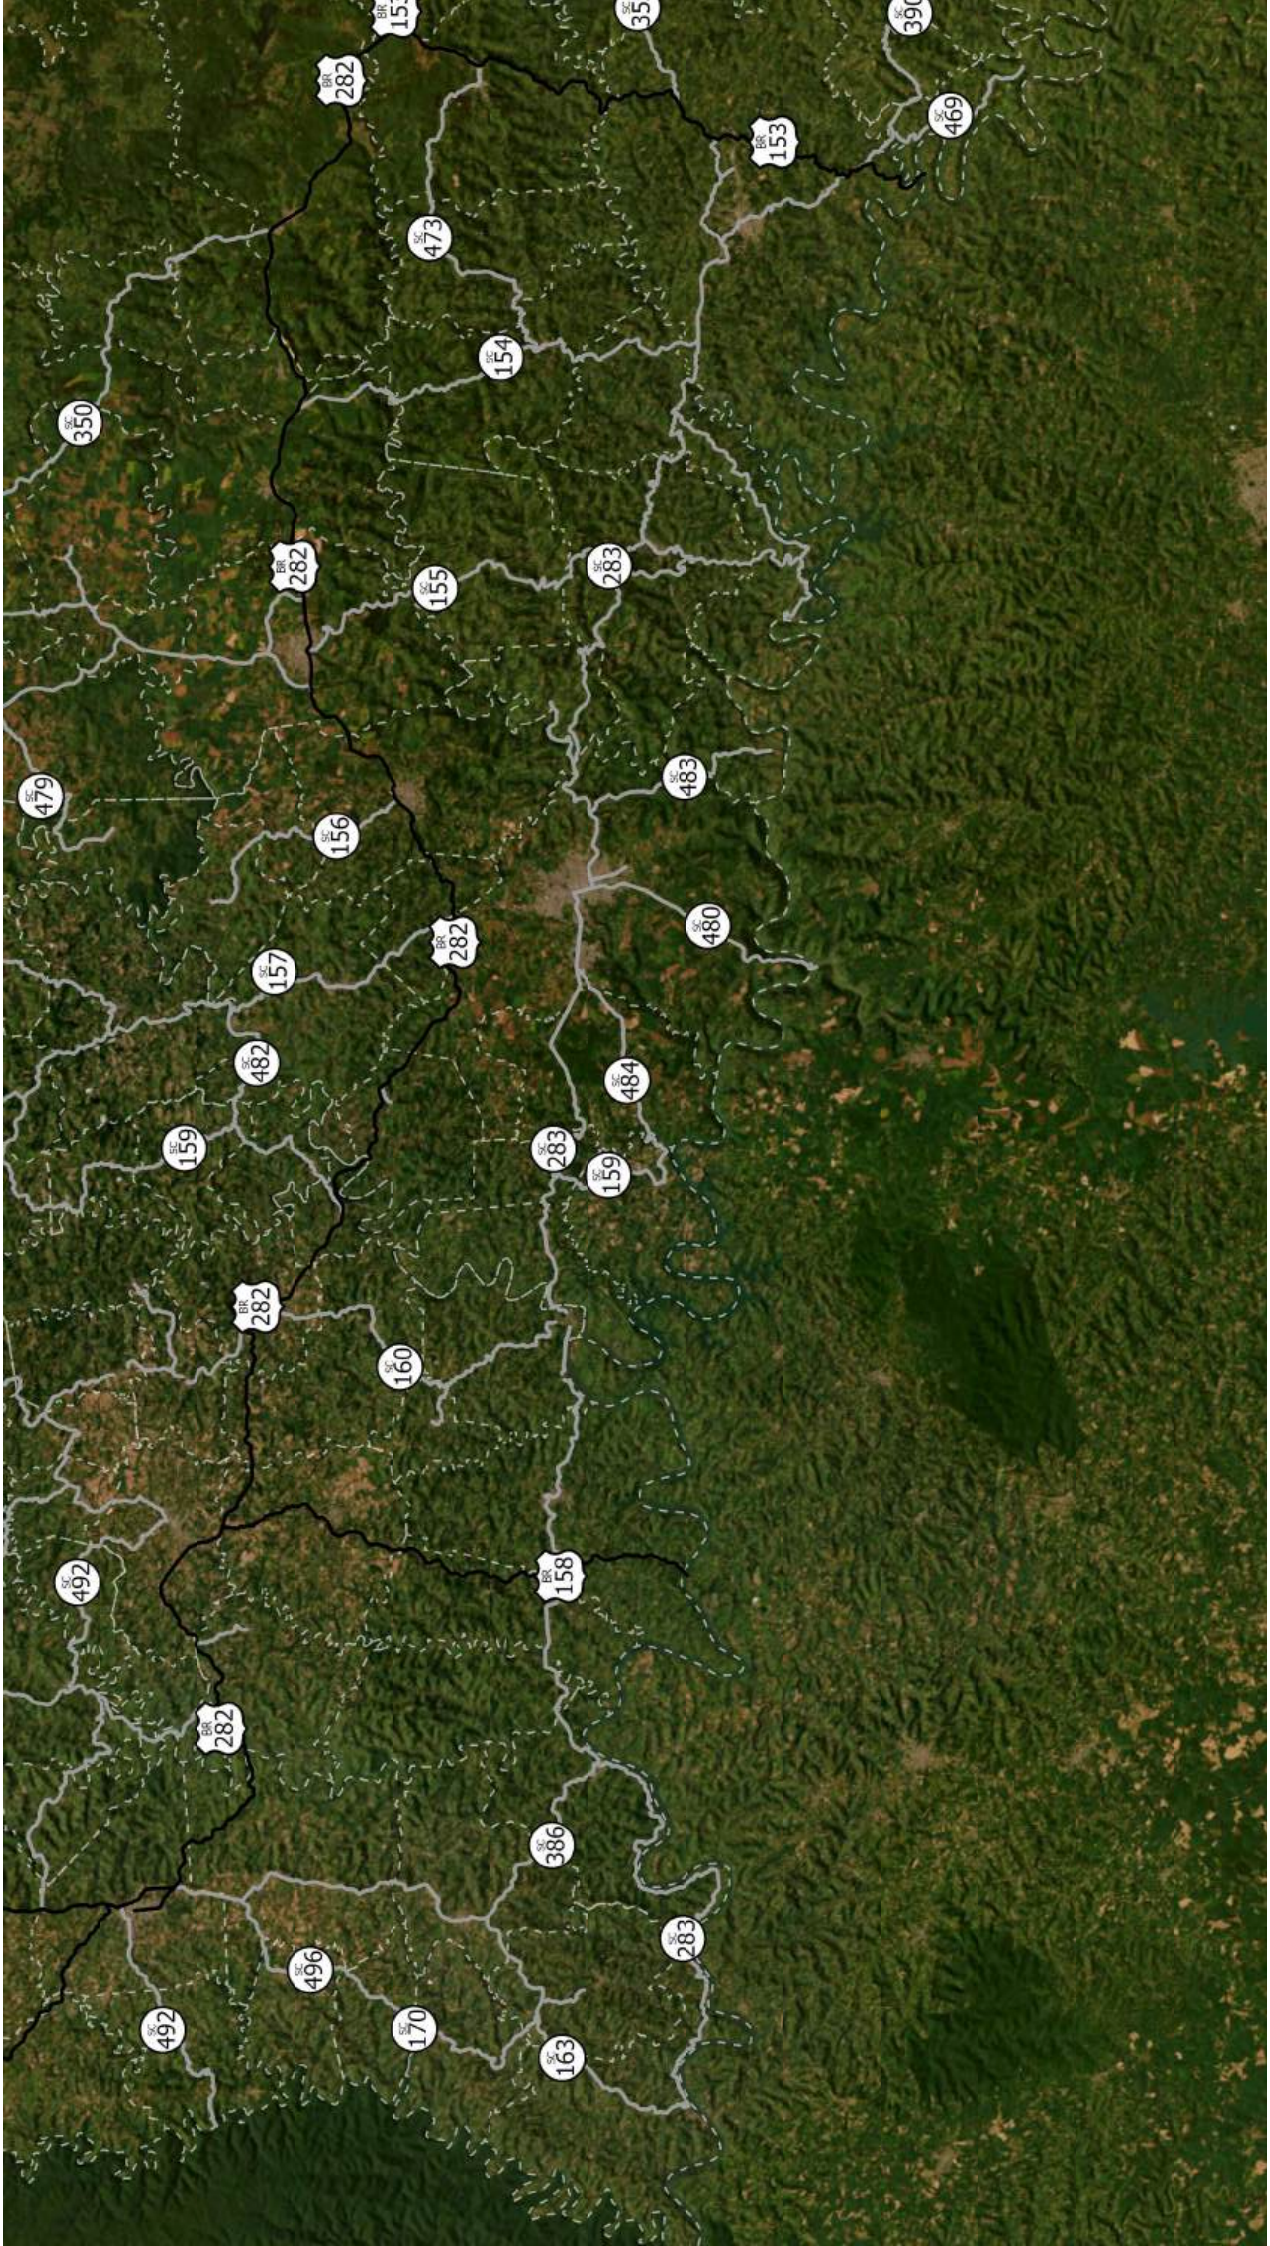

Obras SC-283

Restauração com Aumento da Capacidade da SC-283 trecho entre Concórdia e Arabutã

Investimento
R\$ 37.895.848,88

Extensão
9,94 Km



Obras SC-283

Restauração com Aumento da Capacidade da SC-283 trecho Arabutã Seara

Extensão
26,25 Km



Obras SC-283

Restauração com Aumento da Capacidade da SC-283 trecho entre Seara e Arvoredo

Investimento
R\$ 134.791.585,83

Extensão
27,56 Km



Obras SC-283

Restauração com Aumento da Capacidade da SC-283 trecho Chapecó Arvoredo

Investimento
R\$ 36.835.841,03

Extensão
12,89 Km

Inaugurada



Obras SC-283

Restauração com aumento de capacidade da SC-283 trecho Águas de Chapecó - Palmitos


Investimento
R\$ 84.674.113,17

Extensão
19,98 Km



Obras SC-283

Revitalização da SC-283 trechos Palmitos - Caibi - Mondaí

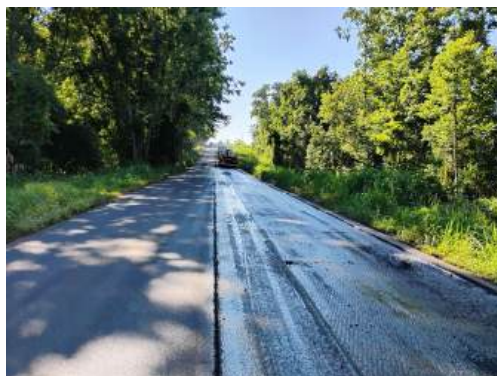



GOVERNO DE
**SANTA
CATARINA**
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
E MOBILIDADE

Obrigado

Jorginho Mello
Governador do Estado

Jerry Comper
Secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade

Ricardo Grando
Secretário Adjunto de Estado da Infraestrutura e Mobilidade
